

# POOL-DECK Anfrage / Bestellformular

Neptun Freizeitanlagen, Pool, Sauna, Teich | 09669 Frankenberg | Lerchenstrasse 02

info@neptun-freizeitanlagen.de | [www.neptun-freizeitanlagen.de](http://www.neptun-freizeitanlagen.de)

Telefon 037206-73909 | Telefax 037206-73910

Anfrage

Auftrag

Besteller	
Firma / Name:	
Straße:	
PLZ / Ort:	
Tel. / Fax:	
Email :	

Endkunde / Montageort	
Straße:	
PLZ / Ort:	

zur Ermittlung der Anfahrten & „vor Ort Begebenheiten.

Datum:

gewünschte Liefer-u.Montagewoche:

**Bitte zutreffende Angaben z.B. Maße, Positionen, etc. ausfüllen !**  
**Bei Fragen oder Unklarheiten bitte uns anrufen !**  
**Wir helfen Ihnen auch Online !**

# Pool-Maßangaben

Bei GKF o.Ä. bitte „rund Ecken“ nicht beachten !

geplant:  vorhanden:

Poollänge:  mm

Hinweis: Innenkante Randstein zu Randstein !

Poolbreite:  mm

Hinweis: Innenkante Randstein zu Randstein !

Becken-Rand-Stein / GKF-Pool oberer Rand:

Breite:  mm

Material:

z.B. Granit, Keramik, etc.

Diagonale A  mm

Diagonale B  mm

Parkposition Fundament = Becken offen:

Vorhanden: ( ja oder nein )

Länge:  mm

Breite:  mm

Tiefe:  mm


angegebene Maße ( vom Auftraggeber ) :

stehen fest

sind errechnet

sind tatsächlich gemessen


können sich noch ändern

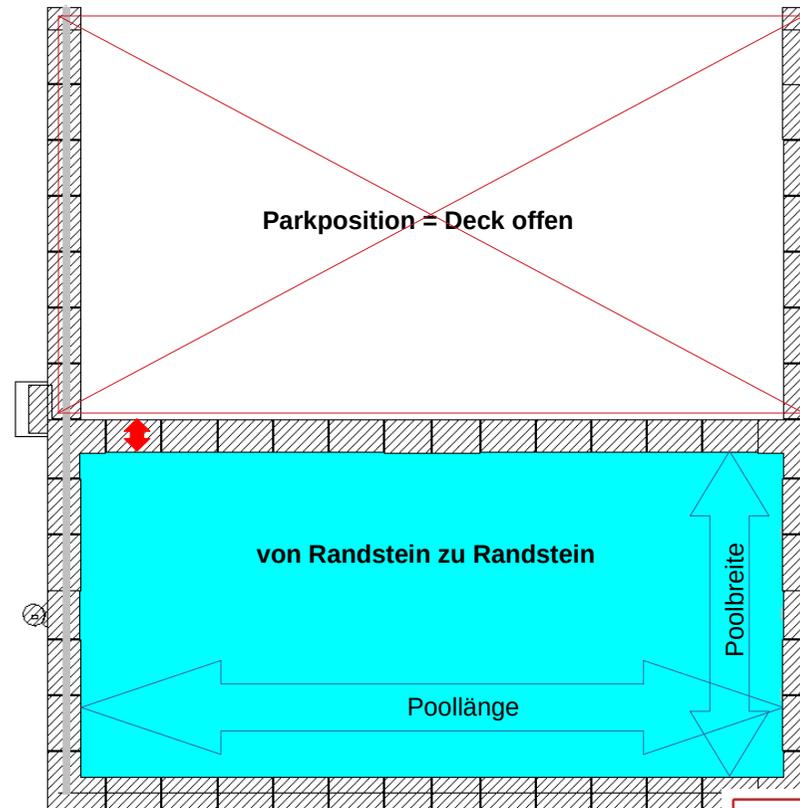




Bauart des Becken :

Fundamente sind bereits fertig gestellt :

Fundamente werden fertig gestellt :



# Erklärung Begriffe

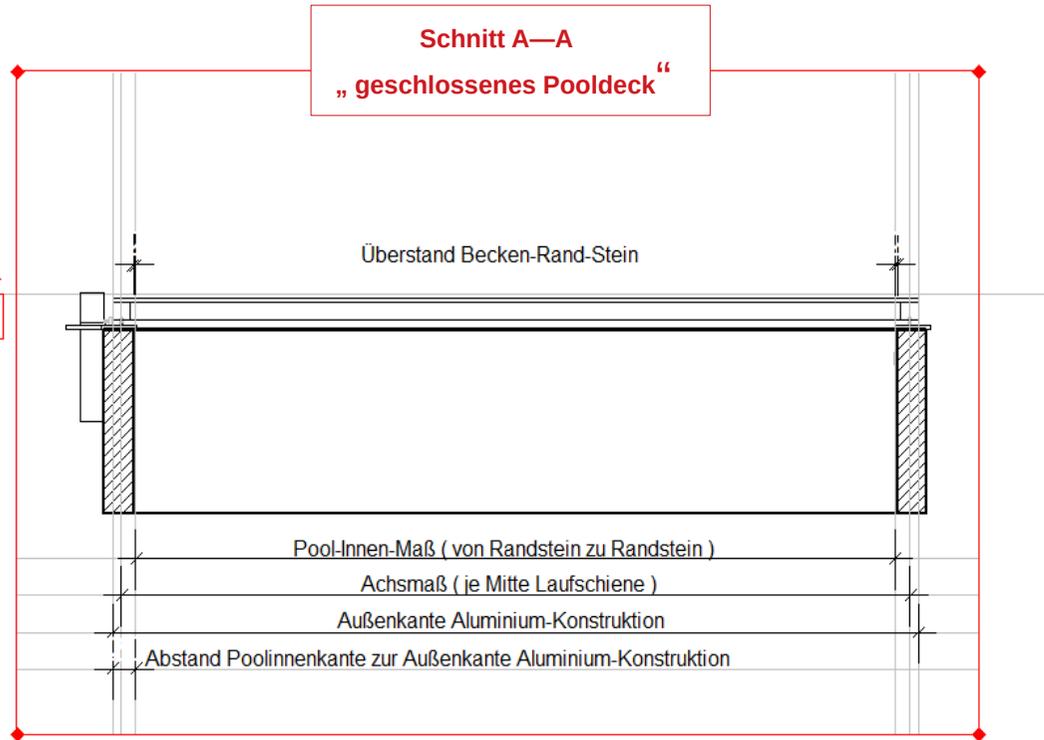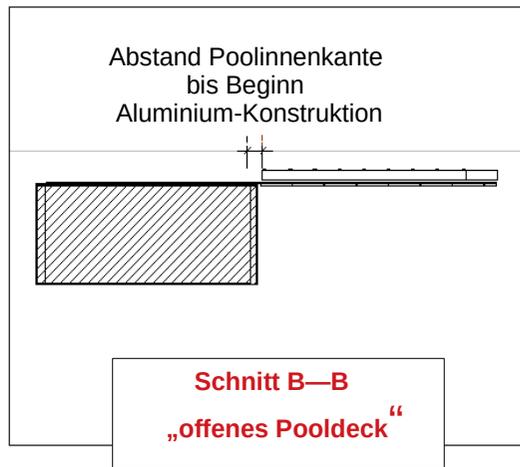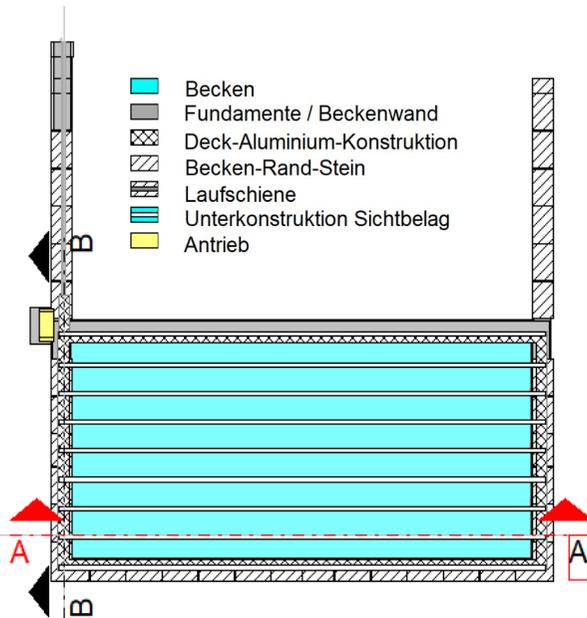

## Typen-Ermittlung

Der jeweilige Typ wird anhand der Spannweite (Breite) ermittelt.


Die angegebenen Maße – Länge, Breite und Höhe – sind immer **Außenkante Aluminium-Konstruktion**.

**Pool-Deck A** / wird über die Poolbreite versetzt

Länge:  mm

Spannweite:  mm

Position  
Laufschiene A oder / und B

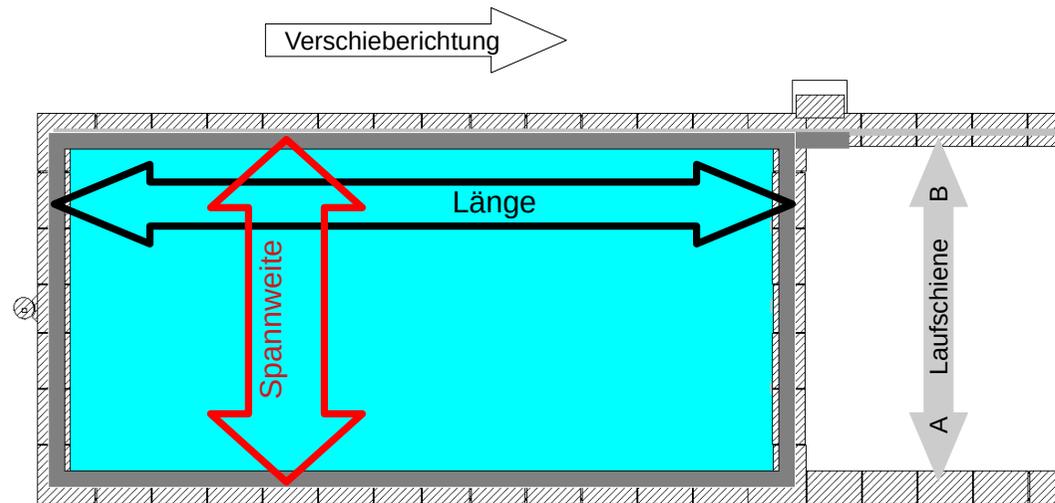

Sichtbelag

z.B. Holzdielen, WPC, Naturstein, Feinsteinplatte, Kunstrasen

Verlegerichtung des Sichtbelages

über die Länge  über die Spannweite

## Typen-Ermittlung

Der jeweilige Typ wird anhand der Spannweite (Breite) ermittelt.


Die angegebenen Maße – Länge, Breite und Höhe – sind immer **Außenkante Aluminium-Konstruktion**.

**Pool-Deck B** / wird über die Poollänge versetzt

Länge:  mm

Spannweite:  mm

Position  
Laufschiene A oder / und B

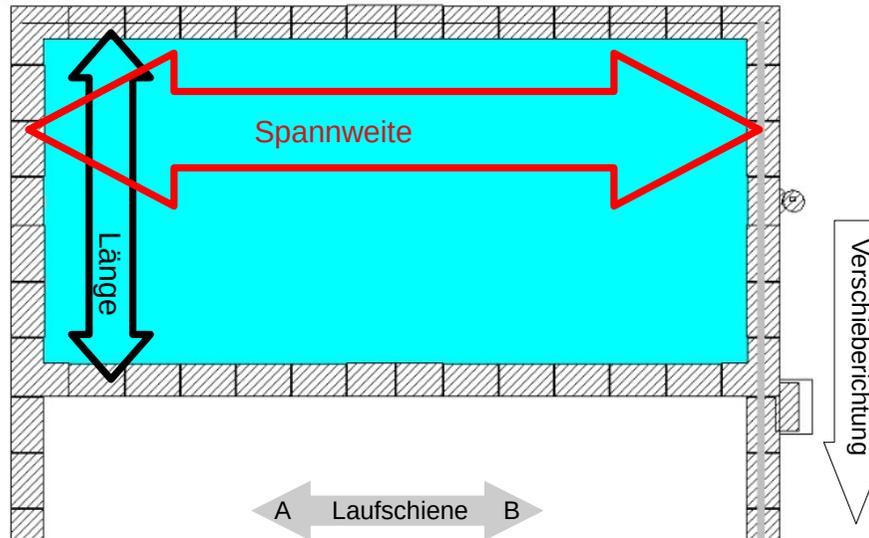


Sichtbelag

z.B. Holzdielen, WPC, Naturstein, Feinsteinplatte, Kunstrasen


Verlegerichtung des Sichtbelages

über die Länge  über die Spannweite


# Ausführung & PositionTypen-Ermittlung




1-teilig



2-teilig



Teleskop-Deck



Pool-Deck im geschlossenen Zustand:

Abstand Pool-Innen-Kante ( Randstein ) bis zur Außenkante Aluminium-Konstruktion ( Deck ohne Seitenverblendung ) =

Pool-Deck im geöffneten Zustand:

Abstand Pool-Innen-Kante ( Randstein ) bis zu Beginn Aluminium-Konstruktion ( Deck ohne Seitenverblendung ) =

( ...siehe: [Erklärung Begriffe](#) / Seite 3)

Sichtbelag

Verlegerichtung des Sichtbelages

über die Länge

über die Spannweite

## Laufschiene/n auf dem Beckenrand

gewünschte Länge inkl. Laufschienenverlängerung bei manueller Verschiebung



=

cm

## Laufschiene versenkt

gewünschte Länge inkl. Laufschienenverlängerung bei manueller Verschiebung

zum Aufschrauben



=

cm

## Laufschiene eingefräst

gewünschte Länge inkl. Laufschienenverlängerung bei manueller Verschiebung

für Punktfundamente




=

cm

## Bodenabstand / vorh. Boden ( Stein, Dielung, WPC, uvm. ) bis Unterkante Deck

lt.Zeichnung / Querschnitt : beträgt die Bodenfreiheit 29mm unter dem Laufschieneprofil



Bodenabstand erhöhen

um

## Antrieb ( Motor inkl. Fernbedienung )

Art und Leistung wird durch uns ermittelt.

Ja / nein

Vormontierte Zahnstange – **zum Nachrüsten des Antriebs**


Ja / nein

Ausführung ohne Antrieb, bei manueller Verschiebung sind Feststeller/Stopper inklusive.

## Zahnstangenverlängerung ( ...ist notwendig; wenn Pooldeck geöffnet & Becken-Rand-Steine komplett sichtbar )

Bitte unbedingt die Wunschposition des Pooldeck im geschlossenen sowie geöffneten Zustand mitteilen.

Motorenseite bei einem einseitigen Antrieb !

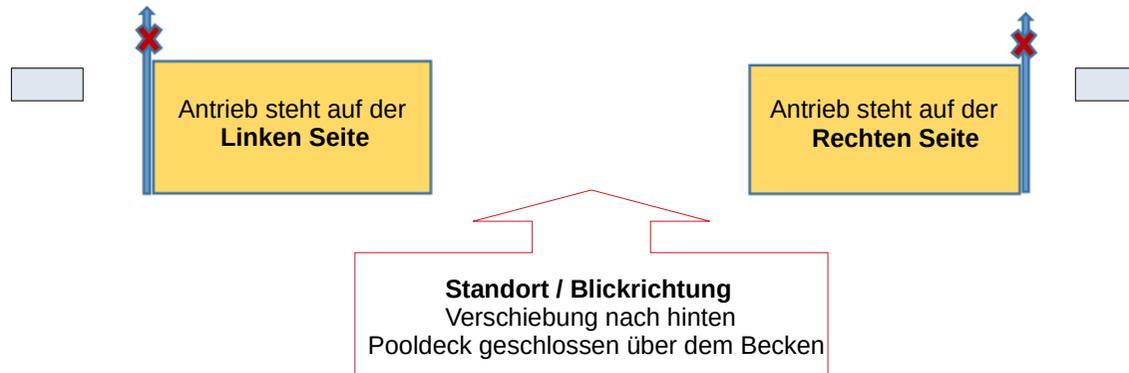

## Sichtbelag & zusätzliche Dämmung


Die bauseitige Verlegung des Sichtbelags erfolgt über die längste Seite, die Unterkonstruktion wird im Werk somit über die kurze Seite gefertigt.

Sichtbelag und Seitenverblendung erfolgt bauseitig

erwünscht ?  
ja / nein Treppenstufe, bei größeren Pooldeck entsteht bedingt durch die Statik ein höherer Tritt !  
die Tritthöhe wird Ihnen beim Angebot mitgeteilt.

mm **zusätzliche Dämmung,**  
Standard ( im Preis enthalten ) = 50mm Styrodur  
( eine Erhöhung des Pooldeck erfolgt dadurch nicht ! )

erwünscht ?  
ja / nein **zusätzliche Aufdopplung für Sichtbelag**  
( ab Werk ohne Aufdopplung )

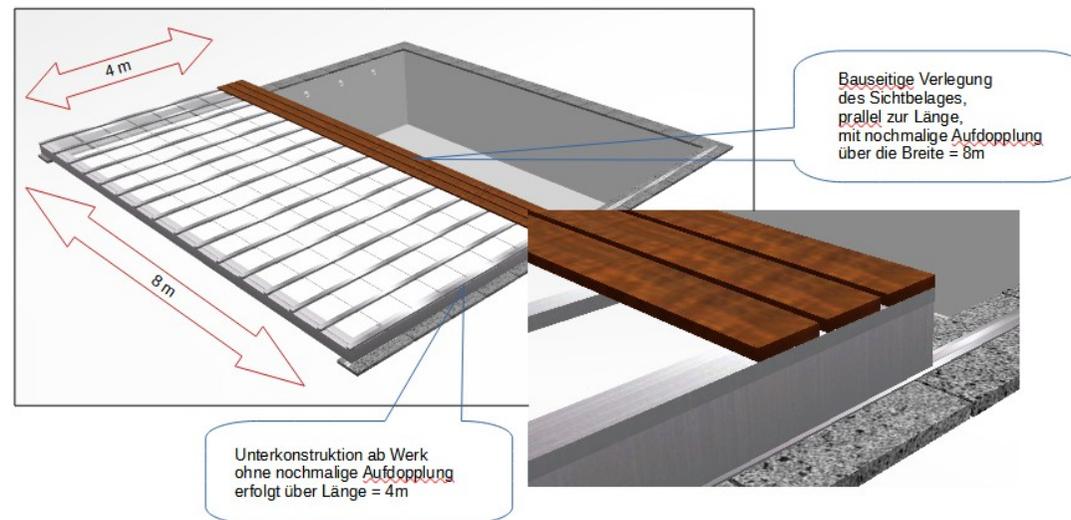

## Fracht & Montage

Es könnten bauseitig Helfer beim Abladen benötigt werden, gemäß Auftragsbestätigung zum Entladen.  
Bei schlechter Zugänglichkeit des Montageortes sowie der Gewichtsrechnung werden ggf. weitere Helfer/Hilfsmittel nach Absprache benötigt.

- Stücklieferung nach Absprache
- Zugänglichkeit des Grundstücks ist gewährleistet
- Helfer gemäß Auftrag vorhanden

Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die Position „ **Fracht & Montage** „ zur Kenntnis genommen habe und damit einverstanden bin :

-----

Berechnungen erfolgen im Angebot nach Entfernungstabelle !

## POOL-DECK Information und Merkblatt

---

### **POOLDECK – Konstruktion / Basis**

Die Tragkonstruktion besteht aus Aluminium-Profilen mit Aluminiumverbindern.  
Montage in Rahmenbauweise.

Das POOL-DECK kann bis zu ca. 100 bis 150 kg pro m<sup>2</sup> (abzüglich des verwendeten Sichtbelages) belastet werden.  
Ein mittiges Absenken bzw. Durchbiegen kann nicht verhindert werden.  
Die Faktoren, Größe und Spannweite, werden im Vorfeld und bei der Fertigung berücksichtigt.

### **Fundamente für die Laufschiene/n**

Das Fundament muss waagrecht und parallel zueinander verlaufen.  
Ein absolut ebenes Streifenfundament entlang des Beckens und „Parkposition“ sind Voraussetzung.  
Das Fundament muss frostsicher gegründet und eine Mindestbreite von 200 mm aufweisen.

### **Besonderheit Laufschiene**

#### Laufschiene versenkt

Sofern die Laufschiene „versenkt“ gewünscht ist, muss beachtet werden,  
dass die versenkte Laufschiene mindestens 70 mm unter Oberkante Beckenrandstein montiert wird.

Die von der versenkten Laufschiene gegenüberliegende Rollbahn muss zur Montage fertiggestellt sein.

Bitte achten Sie darauf, dass das Fundament für den Antrieb die Höhe Oberkante Beckenrandstein aufweisen muss.

Der Laufschienefuß muss nach der Montage vollflächig mit einem Fließbeton aus- und aufgefüllt werden.

Nur so ist eine ordnungsgemäße Lastaufnahme zum Fundament gewährleistet. Eine Ausführung mit Trockenbeton ist nicht zweckmäßig.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei einer gewünschten Vorablieferung und Montage, separate Kosten nach Angebot anfallen.

Begriffserklärung; allgemein / Pooldeck geschlossen  
Ausführung: Typ2, mit Antrieb, Styrodurdämmung  
Laufschiene einseitig auf dem Beckenrand,

